

以证据推动交付

华东三地分阶段交付的依据、边界与执行安排。一份从判断出发，也能沿着证据回看的决策报告。

78%

3

09.06

加权完成率

交付区域

下一决策门

2026-08-31 · 固定验收示例 · 非真实业务



先形成稳定样板再扩大交付

本报告建议继续采用分阶段交付：上海验证稳定样板，江苏完成退款口径闭环，浙江准备培训内容，再复制经过验证的工作方式。三地不必在同一天进入相同阶段，但必须使用同一套完成标准。

截至示例快照日，总体完成率为 78%，确认收入 1,280 万元。四项开放风险中，江苏退款归属月份尚未获得合作方书面确认，是当前管理层数据发布的明确阻断。这个判断只由已列出的台账与事项得出。

保留 09-06 决策门

确认到位则进入统一发布；确认未到则继续推进其他区域，江苏保留双口径。

为什么不一次切换三个区域

区域差异首先体现在交付准备程度。上海的里程碑完成率为 86%，江苏为 76%，浙江为 68%。人员培训、数据口径和证据成熟度并不一致；同步切换会把这些差异转化为同时发生的支持负荷。

分阶段方式把问题限制在可以理解和处理的范围内。上海验证从输入到归档的完整路径，江苏优先取得退款口径确认，浙江把培训资料整理成任务导向章节。样板复制的对象是工作方式、责任界面与验收标准。

把不同步的进度
放在同一套完成标准下

方法也有边界：分阶段会增加版本管理与区域协调成本。因此，每次推进都要记录来源、责任人、完成条件和回退方式，避免同名报告指向不同口径。

量化依据与可解释的差距

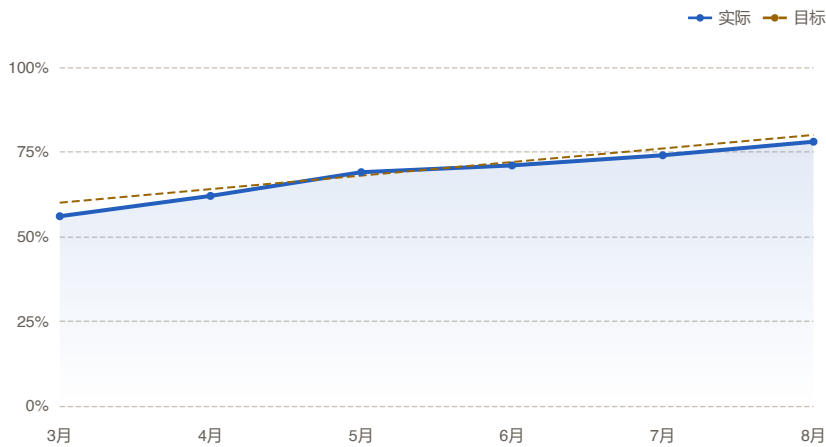


图 1 · 实际与目标完成率 · 零基线 · 来源 AC-04 固定示例台账
8 月完成率 78%，低于目标 80%，差距为 2 个百分点。相比 7 月的 74%，实际进度提高 4 个百分点。收入与风险使用独立口径，不能由完成率直接推断收入增长或风险消失。

原生数据与图表配置 ↗

证据与判断的边界

上海 520、江苏 430、浙江 330 万元，合计 1,280 万元；确认标准为签署验收单。

E-02 / 风险登记 R-03

江苏退款口径缺少书面确认。它支持“暂缓统一发布”的判断，不支持对具体退款规模的推测。

L-01 / 固定示例限制

全部业务数据为 Gary-UI 验收人工编制。它们用于检查排版、交互与信息链路，不用于真实经营决策。

执行安排与完成条件

编号	工作项	责任人	截止	完成条件
GD-104	验收证据自动归档	林岚	09-09	把浏览器截图、导出校验与生成回执关联到同一版本。
GD-108	江苏数据口径复核	周野	09-06	缺少合作方对退款口径的书面确认，阻断管理层数据发布。
GD-112	浙江培训材料定稿	许澄	09-12	补充长中文流程说明与无障碍键盘操作章节。
GD-097	离线制图链路验收	顾言	08-29	ECharts、Markmap、Mermaid、Archify、Infographic 与 Lucide 均从本地加载。
GD-101	导出一致性修复	顾言	09-08	候选版本通过真实渲染后再整体替换 HTML、源文件、SVG、PNG 与回执。
GD-114	客户知识库迁移	沈桥	09-15	迁移 42 篇操作说明，并保持原始来源和章节锚点。

继续分阶段交付

上海继续提供稳定样板，江苏完成口径确认，浙江完善任务培训。将书面确认设为明确门槛，把推进速度与证据成熟度联系起来，让管理层看到的每一个数字都有可解释的来源。

下一次复核 / 2026 年 9 月 6 日

检查 GD-108 确认结果，再决定统一发布或继续双口径。保留上一有效报告，记录本次判断依据。

- 1. DR-07 项目决策记录（固定示例）
- 2. F-08 确认收入台账（固定示例）
- 3. AC-04 里程碑台账（固定示例）
- 4. R-03 风险登记（固定示例）
- 5. Gary-UI Visual Contract v1（本地规范）
